

PROIECTE DN CB

Pasaj Oltenița

Include lărgire La 4 Benzi a Centurii Rutiere A Municipiului București Sud, - **3,69 km** între A2 km 23+600 și A1 km 55+520

Amenajare nod rutier Centura București – DN 4 (Oltenița), km 29+500 – 33+190.

Stadiu fizic: 40%

Ordin de incepere: 31.07.2019

Data finalizare – estimat 2022

Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2 – A2(Pasaj Cernica)

Sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)

Lungime: 11,52 km;

Stadiu fizic: 12,89%

Ordin de incepere: 04.05.2020

Data finalizare – conform contract 2022

"Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520"

Lot 2 - Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600"

Amenajarea nodului rutier implică amenajarea unui sens giratoriu suspendat.

Lungime: 2,41 km

Stadiu fizic: 44,87%

Ordin de incepere: 23.06.2020

Data finalizare – estimat 2022

Proiectarea Pasajului Suprateran pe DJ 602, Centura București – Domnești

Pasajul se construiește la intersecția dintre Strada Prelungirea Ghencea-DJ602 și Centura București


Lungime: 0.536 km

Stadiu fizic: 57,09%

Ordin de incepere: 23.09.2020

Data finalizare – estimat 2022

A0

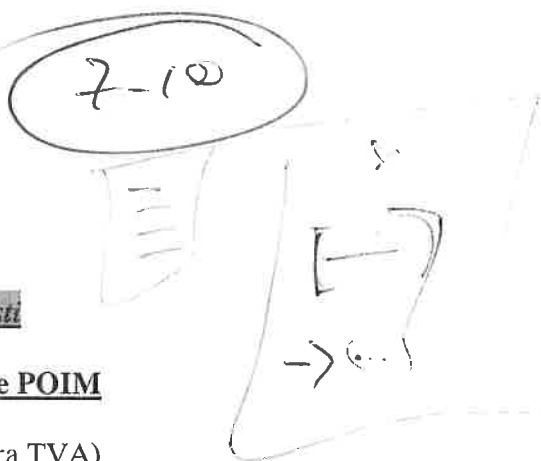

- **Autostrada de Centura Sud a Municipiului Bucuresti**

- **LOTUL 1 Sud (Glina-Vidra) - 16,93 km – in executie POIM**

Valoare execuție: 830,67 milioane lei (fara TVA)
Data începere: 01.03.2021
Data finalizare: Iunie 2023
Stadiu fizic: **17.24%**
Constructor: ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.Ş.

- **LOTUL 2 Sud (Vidra- Bragadiru) - 16,30 km – in executie POIM**

Valoare execuție: 750.849.942,12 Lei (fara TVA)
Data începere: 18.08.2020
Data finalizare: Februarie 2023
Stadiu fizic: **38.10%**
Constructor: ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.Ş.

- **LOTUL 3 Sud (Bragadiru-Joița) - 17,965 km in executie POIM**

Valoare execuție: 853.422.022,52 Lei (fara TVA)
Data începere: 23.05.2019
Data finalizare: Aprilie 2024
Stadiu fizic: **1,20%**
Constructor: Asocierea Aktor SA - Euro Construct Trading 98 SRL

- **Autostrada de Centura Nord a Municipiului Bucuresti**

LOT 1 Nord - DJ601 - DNI (Corbeanca) - 17.5 km - în licitație

Depuse contestatii la desemnarea castigatorului

Valoare estimată execuție: 746.763.568,57 mii lei (fara TVA)
Data finalizare: 2024

- **LOT 2 Nord - DNI (Corbeanca) - DN2 (Afumati)) - 19 km – in proiectare**

Valoare execuție: 831.920.653,34 mii lei (fara TVA)
Data începere: 16.08.2021 (activitate proiectare)
Data finalizare: 2024
Stadiu fizic: **0%**

Constructor: ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER
DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB -
TEHNOSTRADE S.R.L

➤ **LOT 3 Nord - DN2 (Afumati) - DN3 (Cernica) - 8.60 km - în licitație**

Depuse contestatii la desemnarea castigatorului

Valoare estimată execuție: 466.278.289 lei (fara TVA)

Data finalizare: 2024

➤ **LOT 4 Nord - DN3 (Cernica) - A2 - 4.47 km – in proiectare**

Valoare execuție: 312.663.554,09 lei (fara TVA)

Data începere: 2021

Constructor: ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C.
SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.

Data finalizare: 2024

